



## **EU Projekt -- EU-AGRO-BIOGAS**

Projektentwicklung  
Projektverhandlung  
Projektmanagement

*Andreas Moser*

Wien, 18. Jänner 2007



## **Agenda**

- Von der Projektidee zum Proposal
- Phasen EU-AGRO-BIOGAS Project
- Difficulties and challenges
- Partner – Management und Communication



## **Von der Idee zum Proposal**

- Projekt an sich
- Projektmanagement Team für Proposalphase
- Zusammenarbeit Uni – Project Office
- Strategische und S&T Objectives definieren
- Erarbeitung eines Pre-proposals um Partner zu informieren
- Arbeitsplan, Deliverables, Milestones
- Finanzplanung




## **Wer macht was und wann ?**

- Sind Co-ordinator und Partner Rollen klar?
- Wer hat was und wann zu liefern?
- Wer kommuniziert mit den Partnern?
- Wer zirkuliert draft Versionsn? LoIs?
- Wer sammelt feedback von den Partnern?
- Partner Meetings?
- .....




### 5 Phasen – EU-AGRO-BIOGAS project

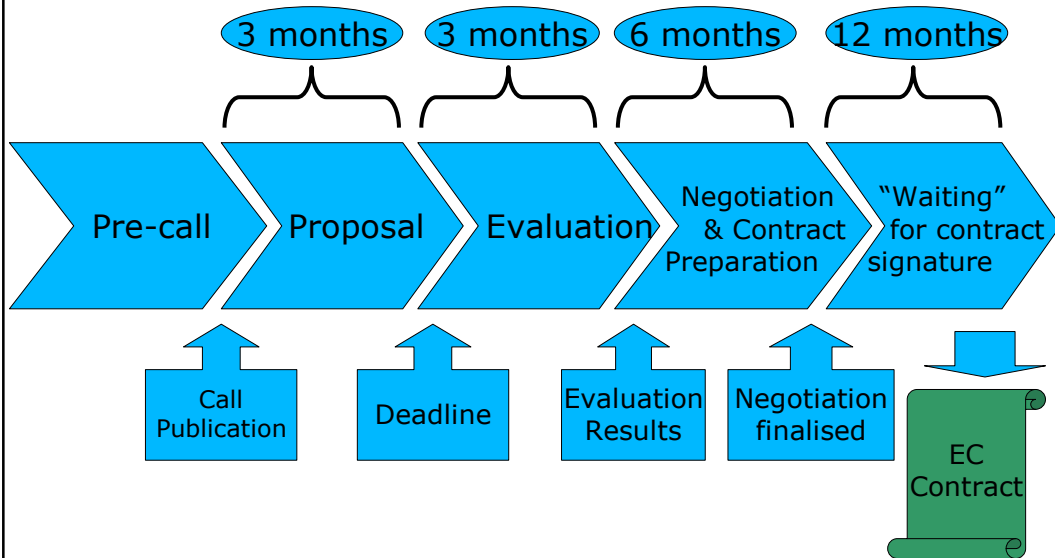

### Difficulties and challenges

- Zusammensetzung Konsortium
  - Finden von Industriepartnern
  - Überzeugung – Demonstration activities
  - Genug Partner – Abdeckung Themenfelder entlang der Wertschöpfungskette Biogas

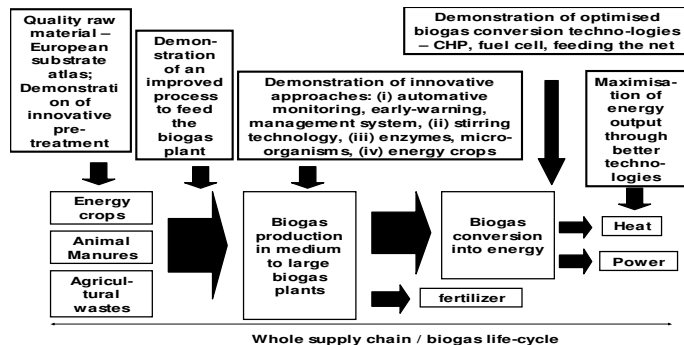

Whole supply chain / biogas life-cycle



## **Difficulties and challenges**

- EC wollte Projekte schnell beginnen lassen
- ABER: Warten auf Vertrag – 12 Monate
  - Partner ungeduldig
  - Geplante Arbeit tlw. Nicht mehr up-to-date
  - Partner bei Laune halten, das Projekt zu machen
  - Wechsel Financial/Legal Officer
- Vertrag vor 2 Monaten erhalten
  - 1 Partner ausgestiegen – Arbeit wird von anderem Industriepartner übernommen
  - Amendment to the Contract gleich zu Beginn notwendig
  - Für alle private organisations Bank Garantien verlangt



## **Difficulties and challenges**

- Vorteil Partner haben sich schon länger gekannt
- Zusammenarbeit einfacher
- Inputs besser und professioneller
- Finanzplanung:
  - Erwartungen und Möglichkeiten
- Einreichung elektronisch
- Verhandlungsphase:
  - Sehr strukturiert von Seiten der EC
  - Abschluß nach ca. 6 Monaten



### **Partner – Management und Communication**

- Eigener Partner nur für Management und Communication
- Teilung scientific management und operative management
- Verwendung einer web-basierenden Projekt management Plattform für Dokumente, Reporting, Event-mgmt., etc.
- Vorbereitung und Moderation der Meetings

[www.rtd-services.com](http://www.rtd-services.com)



## **Thanks for your attention!**

### **Contact Details**

**DI Andreas Moser MES, MBA**

*RTD Services*

Geschäftsführung

Lazarettgasse 3/Tür 4

A-1090 Wien

Tel.: +43 (0)664 83 33 569

E-mail: [moser@rtd-services.com](mailto:moser@rtd-services.com)

Web: <http://www.rtd-services.com>

[www.rtd-services.com](http://www.rtd-services.com)
